

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА — УДАРНЫЙ ФРОНТ!

Совместный выпуск газет «Магнитострой» и «Магнитогорский металл» на пусковых объектах комбината

Положение неудовлетворительное

Анализ положения дел, сложившихся к середине мая на пусковых объектах, возводимых по заказам комбината, показывает: над многими стройками нависла серьезная угроза срыва графиков пуска.

С учетом обязательств строителей, поддержанных руководством комбината, коксовая батарея № 7-бис должна вступить в строй в сентябре. К началу мая здесь было недоосвоено 2,4 миллиона рублей. Хотя, если брать годовую программу строительно-монтажных работ, темпы их ведения в первой трети года были хорошими. Но это — по годовой программе, а ее надо рассчитывать не на 12, а уже на 8 месяцев.

На возведении усреднительных складов привозных руд при плане 2,7 миллиона выполнено строительно-монтажных работ на 520 тысяч рублей. На сооружении мощностей по производству эмалированной посуды повышенного качества выполнено 22 процента запланированного объема работ. Не выполняются планы строительства жилья для металлургов.

В целом по объектам комбината, по подсчетам специалистов управления капитального строительства ММК, отставание от плана велико. Даже с учетом заниженного задания по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выполнено строительно-монтажных работ на 2,2 миллиона рублей меньше.

Неоднократные обращения руководителей УКСа к руководству треста Магнитострой не дали пока что ожидаемых результатов. Большинство пусковых объектов не комплектовано кадрами и механизмами, здесь на низком уровне остается трудовая и технологическая дисциплина. Низка ответственность многих исполнителей за порученное дело.

Пусковая программа нынешнего года включает не только крупные объекты, в том числе реконструкцию стана 2500 горячей прокатки, где тоже крайне велико отставание от плана. В числе пусковых объектов — реконструкция Верхнекизильского источника водоснабжения и расширение пиковой котельной. Оба объекта имеют громадное значение для всего города. И на обоих положение далеко от благополучного. На пиковой котельной, например, в этом году нужно выполнить на 776 тысяч рублей строительно-монтажных работ. К началу мая освоено лишь 196 тысяч, причем в апреле — всего 26 тысяч рублей. На реконструкции источника водоснабжения надо выполнить работ на 58 тысяч рублей. За четыре месяца освоено только 25 тысяч, и ни одного рубля — в апреле. А наступает самый благоприятный период строительства...

Давно стали притчей во языцех правобережные очистные сооружения, без которых город давно испытывает большие трудности. В этом году здесь для подготовки объекта к пуску надо выполнить строительно-монтажных работ на 441 тысячу рублей. К началу мая сделано на 98 тысяч. Только в апреле дела пошли лучше. Но и сегодня судьба обросшего «бородой» объекта остается неясной.

Может быть, руководители строительных управлений, занятых на всех этих объектах общегородского значения, попросту не представляют степени этого значения? Можно напомнить: очистные сооружения рассчитаны на очистку 65 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Новый котел на пиковой котельной сможет давать ежедневно 100 гигакалорий тепла. Жители южных микрорайонов города не первую зиму ждут этого подкрепления. Кстати, среди них — не одна сотня семей строителей.


Есть среди пусковых один важный объект природоохранного назначения. Речь идет о гидрозолупородовалах. В этом году только на выполнении неотложных мероприятий здесь надо произвести строительно-монтажных работ на 270 тысяч рублей. На первый взгляд, что это за сумма? Но и она осваивается замедленными темпами. К началу мая здесь выполнено строительно-монтажных работ на 131 тысячу рублей, из них только на 12 тысяч — в апреле. Вместо усиления темпов наблюдается, напротив, их снижение. А ведь и на строительстве отвалов лето — наиболее благоприятный период года...

Можно согласиться со специалистами УКСа комбината: картина на пусковых объектах нынешнего года действительно мрачная. И такое положение сложилось несмотря на то, что в этом году комбинат заказал работ на меньшую, чем в прошлом году, сумму. И даже она не осваивается. Нужны серьезные срочные меры, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

С. КУЛИГИН.

Один из важнейших для всего города объектов, возводимых по заказу комбината, — вторая очередь пиковой котельной. Мощный котел, входящий в комплекс этого объекта, позволит снять действительно «пиковое» положение с теплом в южной части города, где проживают сейчас многие десятки тысяч магнитогорцев.

Фото В. ДУБРОВСКОГО.

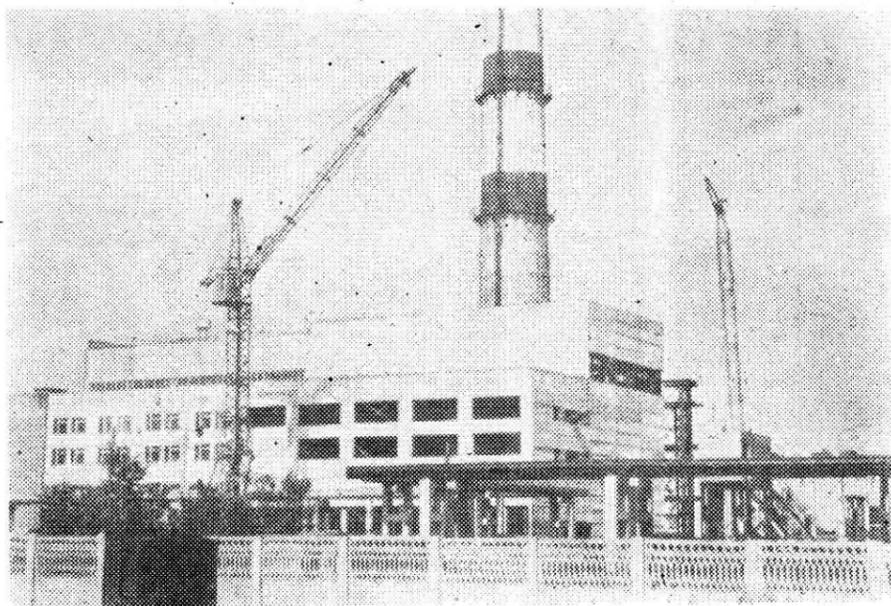

Победители известны

Общественный штаб строительства коксовой батареи № 7-бис подвел итоги социалистического соревнования участков и бригад за апрель.

Среди коллективов прорабских участков лучших результатов добились представители 5-го стройуправления во главе с прорабом Р. Г. Абдрахмановым. Этот коллектив представляет на стройке генподрядное управление и свою задачу выполнил в апреле достойно. Месячный план освоения капиталовложений участка Р. Г. Абдрахманова выполнен на 108 процентов. В среднем труженники участка перекрывали нормы выработки на 5 процентов.

На второе место вышли представители субподрядного управления Южуралэлектромонтаж, руководимые начальником участка А. С. Клементьевым. Второй месяц подряд этот коллектив занимает ведущие позиции в соревновании участников важной стройки. В минувшем месяце он перекрыв план освоения капита-

ловложений на 28 процентов. Средняя выработка монтажников педеродового участка превысила в апреле плановый уровень на 8 процентов.

Среди коллективов бригад первенство за апрель по праву присуждено плотникам-бетонщикам 5-го управления во главе с В. Л. Михайловым. Не напрасно этот коллектив считается одним из лучших в своем управлении. Бригада не раз за время строительства батареи добивалась крупных успехов, завоевывала призовые места в соревновании подразделений треста.

Хороший вклад в выполнение поставленных задач внесла бригада слесарей под руководством В. А. Гредчина из управления Сантехмонтаж. В минувшем месяце дружный коллектив добился большой трудовой победы: был подписан первый акт об окончании работ на под-

станции № 70. В апреле бригада Гредчина выполнила план строительно-монтажных работ на 150 процентов.

Ширится размах соревнования за приз имени поэта Магнитки Б. А. Ручьева. Этот приз по условиям соревнования присуждается коллективу, добившемуся наибольшей производительности труда. На сей раз право обладания почетным призом получила бригада монтажников Б. К. Пещерова из управления Южуралэлектромонтаж. В этом коллективе план по производительности труда выполнен в апреле на 180 процентов!

Общественный штаб стройки поздравил лидеров соревнования с высокими трудовыми достижениями и выразил уверенность в том, что строители и монтажники с честью выполнят принятые обязательства.

Общественный штаб стройки.

Мнение заказчика

На первый взгляд, положение на важнейшем объекте года — строительстве коксовой батареи № 7-бис — складывается благополучно. Своевременно поступает на площадку батарей необходимое оборудование. У коллектива управления капитального строительства комбината крепнет уверенность в том, что к назначенному сроку, к концу мая, предосточный монтаж оборудования новой батареи удастся закончить.

Если бы весь комплекс пускового объекта состоял из одной только батареи! Беда в том, что на целом ряде других важных участков дела складываются с каждым днем все хуже. Намеченные несколько узлов, которые срочно должны быть развязаны.

До конца мая — первых чисел июня необходимо закончить соединение общего боровы с дымовой трубой. На важнейшем участке сейчас отставание от графика работ достигает 20 дней. С задержкой выполняли

свои задания коллективы Земстроа — он только 12 мая закончил работы — и Спецпромстроа. Следом за этими организациями должен приступить к делу коллектив Бетонстроа. На него остается вся надежда по ликвидации отставания от графика. Подкрепляется она расчетом на то, что бетонстроовцы начнут с первых дней работать в три смены по скользящему графику.

Мало соединить дымовую трубу с боровом — саму трубу нужно еще зафутеровать. Работа поручена коллективу Спецжелезобетонстроа. Но на сегодня из 120 метров выполнена футеровка лишь одного метра. И руководители коллектива в таких условиях планируют на май выполнить работы только на 50 погонных метрах трубы. Кого могут устроить такие темпы?

С отставанием от графика ведутся работы на перегрузочном узле, коксовой рампе. На тушной станции коллектив Спецжелезобетонстроа выполнил бетонные работы за полто-

ра месяца на... полутора метрах. Руководство этой организации проявляет на строительстве сдельной-бис удивительную неорганизованность, подрывая прежнюю веру заказчика в солидность давнего делового партнера. На той же станции медленно ведут работы коллективы Земстроа, Бетонстроа.

Все эти объекты комплекса новой коксовой батареи имеют для пуска агрегата жизненно важное значение. И всюду, как видим, работы ведутся с отставанием от намеченного графика. А сроки завершения строительства, монтажа и, наконец, пуска мощнейшей коксовой батареи никто не отменял. И приближаются они неминуемо. Одно можно сказать в таких условиях: всем участникам строительства нужна сегодня максимальная собранность и высокая ответственность за судьбу пускового комплекса.

Х. КАРИМОВ,
начальник бюро управления капитального строительства ММК.

ЗАБЫВАЯ МЕЛОЧАХ

До завершения предрасторочного монтажа на коксовой батарее № 7-бис осталось не так уж много времени. Однако у многих исполнителей — это касается прежде всего руководителей строительных управлений — дела идут сейчас не лучшим образом.

На две недели сдвинуты сроки передачи фронта работ по дренажной насосной и дымовому борову. Последний объект был, наконец, передан коллективу смежного строительного управления № 3. Ставить на этом точку рано: без дренажной насосной нельзя считать операцию завершенной. Тем не менее главный инженер управления Земстрой В. Н. Ляшутин объясняет ситуацию тем, что, мол, были установлены нереальные сроки выполнения задания для его коллектива. Отсюда — отставание.

На камере сушки воздуха не готовы котлованы под фундаменты, не убраны леса. Руководители участков занятого здесь четвертого управления треста вместо того, чтобы оперативно разобраться в ситуации и заставить исполнителей выполнить свои работы, разводят руками и утверждают: нет фронта работ.

До сих пор не подготовлен график выполнения работ по благоустройству территории смежных коксовых батарей: действующей № 8-бис и строящейся № 7-бис. На комплексе до сих пор практически нет ни одной благоустроенной дороги. Мало сказать, что десятки водителей автотранспорта вынуждены преодолевать «полосу препятствий», — акт о приемке новой батареи не может быть подписан без полного благоустройства прилегающей территории.

Вызывает тревогу ход поставки необходимой арматуры для ведения монтажа оборудования новой батареи. Часть запорной, отопительной и другой арматуры, завезенной на площадку, забракована, другая часть пока что отсутствует...

Такое положение дел на основном пусковом объекте года чревато серьезными последствиями. Выполняя в целом свои обязательства, заказчик забывает порой о мелочах. А без них — никуда.

А. ЕРОФЕЕВ,
редактор радиогазеты на строительстве коксовой батареи № 7-бис.
