

**РЕКОНСТРУКЦИЯ
КОМБИНАТА
УДАРНЫЙ
ФРОНТ!**

Сообщает совместный контрольный пост газет «Магнитогорский рабочий», «Магнитогорский металл», «Магнитострой» на пусковых объектах комбината.

**ГРАФИК АКТОВ
И „ГРАФИК“ ФАКТОВ**

Можно довести объект до высокой строительной и монтажной готовности, начинить его оборудованием... не вести по графику в строй действующих. Именно такая ситуация угрожает сегодня пуску коксовой батареи № 8-бис.

На первый взгляд, этот вывод построен на песке. В самом деле, подается тепло и электроэнергия на объекты «восьмерки-бис», ведется разборка тепляка, в графике послерасточный монтаж, да и температура в камерах спекания кокса самой батареи возрастает день ото дня, перешагнув уже за 210 градусов. Больше того, коллектив Коксохиммонтажа решил упрямиться с послерасточным монтажом за месяц, — на неделю опередив график. Казалось бы, радоваться надо, но всего этого для радости недостаточно. Все упирается в сдачу актов строительной и монтажной готовности объекта, которая, прямо скажем, идет так медленно, что ставит под угрозу срыва пуск батареи в этом году.

По неоднократно уже откорректированному графику на строительстве 8-й батареи всего надо сдать 461 акт. В этом месяце коксостроители должны сдать 240, то есть по десять в день. Но первая же декада ноября показала всю глубину прорыва: исполнители так и не подготовились к активной сдаче актов. Всего за первую декаду их подписано лишь 20. Зная, что в месяце три де-

кады, нетрудно подсчитать, сколько актов при таких темпах сдадут строители и монтажники к первому декабря. А ведь не меньше их осядет и на пусковой месяц, который для коксостроителей столь же короток, как и февраль: они намереваются пустить батарею к 28 декабря — 50-летию коксохимического производства. Ясно, что темп сдачи актов надо резко наращивать.

Однако этого-то стремления и не чувствуешь на оперативках, где изо дня в день, отчитываясь о сдаче актов, каждый исполнитель называет все те же цифры. Второе управление повторяет, что из пяти актов сдано четыре. Бетонстрой свидетельствует: из 18 подписано 16, причем два акта не оформляются с первого ноября. Три акта задолжало четвертое управление. О девяти вместо 13 отчитывается генподрядное управление № 5. В хронических должниках ходят шестое и седьмое управления. «Не отстают» от них и субподрядчики.


Всем без исключения исполнителям, задействованным на строительстве коксовой батареи № 8-бис, необходимо в короткий срок изменить отношение к сдаче актов. Лишь в этом случае батарея выдаст своевременно первый коксовый «пирог».

Н. СТАРКОВ,
профорг на строительстве коксовой батареи № 8-бис.

Комсомольско-молодежный коллектив плотников-бетонщиков второго стройуправления треста Магнитострой во главе с Зарифом Яппаровым хорошо зарекомендовал себя на строительстве коксовой батареи № 8-бис. Сейчас бригада заканчивает возведение галереи к перегрузке 15-В угольного тракта.

На снимке: бригада З. ЯППАРОВА.

Фото В. Дубровского.

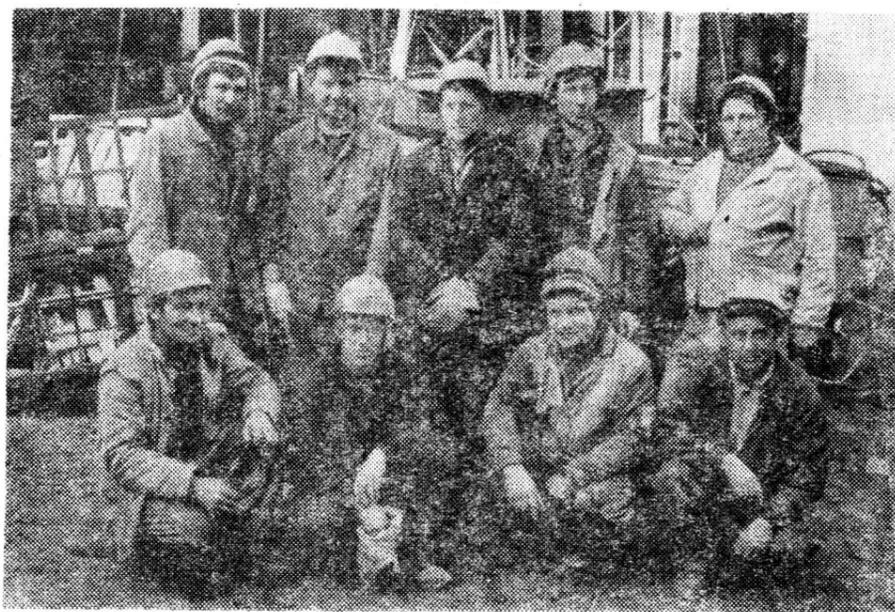

СЛОВО О ТРАКТАХ

Без угольного тракта не будет дробленого угля для коксовой батареи № 8-бис. Без коксового тракта продукцию этой батареи хоть на землю вываливай. А без того и другого «восьмерка-бис» представляет собой бесполезное сооружение.

Как же идут дела на этих трактах?

Угольный...

11 ноября пусконаладочное управление Востокметаллургмонтажа не монтировало оборудование на перегрузках 33-А и 33-В. Его представитель объяснил это на оперативке тем, что не успели вчера заказать оборудование. Из-за элементарной недисциплинированности исполнителя потеряны сутки в предпусковое вре-

мя. Кстати, список подобных фактов можно было бы удлинить.

...И КОКСОВЫЙ

По графику на сооруженные галереи К-9 и К-10 Уралстальконструкции отводилось 20 дней. Исток месяц, но... не выполнено указание управляющего трестом Магнитострой Н. С. Мо-

лошикова о трехдневной работе на этих объектах, и галереи не готовы.

Сантехмонтаж не приступил к работе по подаче тепла на коксосортировку и обещает оделать это лишь к 1 декабря. Кого может устроить такой срок?!

А вывод из всего вышесказанного один: необходимо повысить спрос с каждого исполнителя, чтобы выпечка первого коксового «пирога» состоялась, как и намечено, 28 декабря сего года. **В. ТУМАНОВ,** корреспондент газеты «Магнитострой».

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ

Прокрутка оборудования на объектах коксовой батареи № 8-бис, бесспорно, сдвинет с мертвой точки сдачу актов строительной готовности. Но уже несколько раз срывался, а потом корректировался график пуска.

На неделю срывает начало пусконаладочных работ Южуралэлектромонтаж. В числе отстающих — Промвентиляция, пусконаладочное управление Вос-

токметаллургмонтажа. Ясно, что всем исполнителям, ответственным вместе с эксплуатационниками за прокрутку оборудования, необходимо напрячь усилия.

Время не ждет. Сроки, отведенные на прокрутку оборудования, окончательно составлен график послерасточного монтажа и перевода батареи на постоянный обогрев. 25 ноября должен заработать кантовочный механизм. Необходи-

мо опробовать в работе дробильное отделение — первый этап угольного тракта. Тракт подачи угля необходимо опробовать в первую очередь.

В отделении окончательного дробления уже работают дробилки. Предъявлена к сдаче 45-я галерея. Все это свидетельство того, что там, где исполнители концентрируют усилия, дело идет на лад. **М. СМОЛЕНСКИЙ.**

ВСТРЕТИЛИСЬ на строительстве коксовой батареи № 8-бис представители отдела оборудования управления капитального строительства металлургического комбината и Южуралэлектромонтажа. Не стали вдаваться в долгие речи — о том, сколько энергии, сил и нервов затратили одни, чтобы «выбить» электрооборудование для батареи, сколько раз говорилось на оперативках о том, что оно нужно электромонтажникам, как воздух, — а ограничились коротким диалогом:

- Даете электрооборудование на насосную турбинную башню?
- Даем. Когда завезти его на стройплощадку?
- Привозите под праздник.

Вот так договор!

Ясно, четко и коротко, как и подобает при ведении делового разговора. Но пятого ноября электромонтажники дали отбой: дескать, нет у нас лишних глаз, чтобы следить за сохранностью электрооборудования в праздничные дни, вы уж лучше, братцы, привезите его нам девятого числа.

А девятого ноября никто и не подумал взять это электрооборудование. Даже посоветовали отвезти его обратно на склад комбината. Долготерпение заказчика лопнуло, и его представитель связался с начальником Южуралэлектромонтажа В. А. Василенко: примите, мол, заказанное вашим управлением оборудование, оно ведь уже на строительной площадке.

Начальник управления, понятное дело, связался со своими подчиненными на самой батарее и, конечно же, посоветовал им принять оборудование. «А те, видимо, вновь в амбицию: посоветовали в свою очередь УКСу без долгих телефонных разговоров отвезти-таки оборудование на склад, потому что не подготовились к его приему.

И отправились на склад ОТО две машины, нагруженные «под завязку» пятнадцатипанельным щитом и шестью ящиками с другим электрооборудованием. Что и говорить, «крепкий» вышел договор! И это в то время, когда каждая минута промедления на строительстве коксовой батареи затягивает ее ввод в эксплуатацию.

В. ЕРШОВ,
водитель УКСа металлургического комбината.

КОЛЛЕКТИВ отдела оборудования управления капитального строительства комбината заканчивает комплектование коксовой батареи № 8-бис своего пускового комплекса. Судя по данным, представленным руководителем ряда бюро отдела оборудования, свою задачу снабженцы комбината выполняют за две-три недели.

◆ Поставки оборудования

**КОМПЛЕКТОВАНИЕ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ**

те последними принимали участие коллективы кузнечно-прессового и механического цехов. Им оставалось к началу второй декады ноября выполнить два заказа на изготовление нержавеющей фланцев, узлов роликов. В механическом цехе коллектив участка, руководимый В. И. Ганозиним, примерно половину узлов роликов уже собрал и передал представителям отдела оборудования. Оставшиеся изделия, как сообщил В. И. Ганозин, будут переданы для монтажа до конца ноября.

Заканчивает большую работу и коллектив технологического бюро отдела оборудования. Сейчас ведется комплектование электрочасти и механиче-

ского оборудования второго двересъема. Выдаются монтажникам узлы и детали электрочасти первого двересъема. Технологическое оборудование, как отмечает начальник бюро М. Ф. Тарасова, в основном в наличии. Правда, возникают вопросы по поводу отсутствия или замены отдельных мелких деталей, но это, как говорится, погоды не делает. Основной объем работ уже позади.

Осталось получить три реверсивных крана. Кстати, те, что уже поступили, выполнены некачественно. С завода-поставщика вызваны представители для устранения брака на месте. В ближайшие дни ожидается прибытие последних ленточных конвейеров.

Говоря о комплектовании пускового комплекса технологическим оборудованием, М. Ф. Тарасова отмечает:

— В этом году мы добились того, что коллективы заводов-поставщиков напрямую стали нести ответственность за свою продукцию. Причем, ответственность не только моральную — устранение завод-

ских дефектов каждое предприятие ведет на месте монтажа силами своих работников. Мы отказались от бытовавшей прежде практики приглашать для устранения заводского брака коллективы расположенных в Магнитке подрядных монтажных организаций. В самом деле, почему комбинат должен платить свои деньги — и порой немалые — за устранение брака предприятия-поставщика? С этого года расходы по устранению дефектов несут сами изготовители.

Не имеют претензий к заказчику в отношении энергетического оборудования руководители Коксохиммонтажа. Сегодня комплектование пускового комплекса насосами и задвижками, вентиляторами и другим энергетическим оборудованием подходит к концу. Начальник энергетического бюро отдела оборудования УКСа А. Н. Вепринцев заверил, что все оставшиеся узлы и детали будут выданы монтажникам до конца месяца.

Обеспечить своевременный пуск батареи — этим озабочены сегодня вместе с сотнями строителей и монтажников работники отдела оборудования. И эта озабоченность проявляется в деле.

Ю. СКУРИДИН,
корреспондент газеты «Магнитогорский металл».

**Разговорами
сыт не будешь**

Где обедать коксохим-строителям? На первый взгляд, можно пообедать у своих друзей — коксохимпроизводственников. Но те дают предельно понятный ответ:

— Дружба дружбой, а столоваться врозь. Мы в своих раздатках и столовых сами еле успеваем по графику пообедать. Так что заботьтесь о горячей пище для себя сами, вы ведь строители, вам все карты в руки.

Посмотрели коксостроители в чертежи и обрадовались, обнаружив, что в комплексе коксовой батареи № 8-бис предусмотрена и столовая на 155 посадочных мест. Решили построить ее штурмом, обжить как следует, а потом вместе с первым коксовым «пирогом» с «восьмерки-бис» преподнести ее в подарок эксплуатационникам: мол, знаете наших, вы нас в свою столовую не пускали, на тесноту жаловались, так вот вам новая чудо-столовая.

А пока суд да дело, привезли строители на площадку вагончики-раздатки, да все лето и промучались с ними. Правда, какой ни обед, а все же обед. А комфортабельная столовая в это время строилась. Генподрядное управление № 5 ее стены возводило. Брига-

ды В. Дурова и А. Сутулы из Промотделстроя вели отделку. Сантехмонтажники и слесари Промвентиляции всевозможным оборудованием начиняли. Да только велось строительство этой столовой, что называется, воробьиным шагом — не планомерно, а наскоками.

Руководство строительного комплекса в лице заместителя управляющего трестом Магнитострой А. А. Харина вспомнило о столовой лишь времени от времени. Вело разговоры о ее строительстве и даже поручивало того или иного нерадивого исполнителя. Потом наступило затишье. А время катилось себе да катилось, и осталось в конце концов до пуска батареи 42 дня. Обеды для строителей во временных раздатках того и гляди ледком затянут.

А. ЛЫЧЕВА,
бригадир комсомольско-молодежной бригады Промотделстроя.

ОТ РЕДАКЦИИ. 11 ноября подписаны, наконец, акты рабочей комиссии, но и сейчас пригласить строителей в новую столовую нельзя. Санэпидстанция запрещает открывать столовую, пока анализы воды не достигнут нормы. В ожидании этого истекает уже неделя.
