

# МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ВЫПУСК  
НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ

№ 2

Воскресенье 3 апреля 1949 года

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина.

## Работать так, как работают передовые бригады огнеупорщиков Горобец, Горячева и Бакутина!

### СТРОГО ПО ГРАФИКУ СДАВАТЬ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

На ремонте комсомольско-молодежной домны № 6 разработан и уточнен график сдачи каждым цехом отремонтированных объектов. Ответственные задачи стоят перед огнеупорщиками, монтажниками, механиками. 5 апреля должна быть завершена основная работа огнеупорщиков — кладка в шахте. К этому сроку механики и электрики должны смонтировать новую электропушку, оборудование машинного зала. К 4 апреля механики и электрики должны кончить работы на засышном аппарате, к 6 апреля они же должны завершить монтаж гризлей и вагон-весов.

Все сроки вполне реальны. Передовые бригады огнеупорщиков на деле показывают, как надо форсировать кладку при высоком качестве и с перевыполнением нормы. Немалые успехи имеют монтажники, механики и электрики.

Следовательно, судьба четкого выполнения графика сейчас всецело зависит от организации работы в бригадах, от действительного социалистического соревнования ремонтников. На каждом участке нужно твердо помнить и о труде своих смежников, не допускать задержек, не создавать перебоев. До сих пор были случаи, когда при подеме рабочей площадки внутри домны монтажники надолго прекращали работу огнеупорщиков, нарушали кладку шахты. Огнеупорщики, затягивая футеровку самоваров, тормозили монтаж клапанов горячего угля. Электрики до сих пор не получили из проектного отдела комбината проект электрического оборудования пушки.

Эти неполадки необходимо устранять, чтобы весь процесс ремонта шел планомерно. Передовики социалистического соревнования должны проявить еще больше инициативы и изобретательности, вести за собой отстающих, добиваясь еще больших производственных побед.

На стахановских вахтах в честь XI съезда ВЛКСМ, X съезда профсоюзов и 1 Мая ремонтники должны проявить всю свою сметливость и старание, чтобы с честью выполнить свое основное обязательство — вернуть в строй домну № 6 раньше установленного срока.


★ ★ ★

На огнеупорной кладке шахты доменной печи № 6 отлично работает бригада Андрея Мироновича Бакутина. Вместе с огнеупорщиками своей бригады — Вениамином Скорняковым и Борисом Киряковым он выполняет ежедневно свыше двух норм при отличном качестве кладки.

На снимке (слева направо): бригадир А. М. Бакутин, огнеупорщики В. Ф. Скорняков и Б. П. Киряков за работой.

Фото П. Рудакова.

★ ★ ★

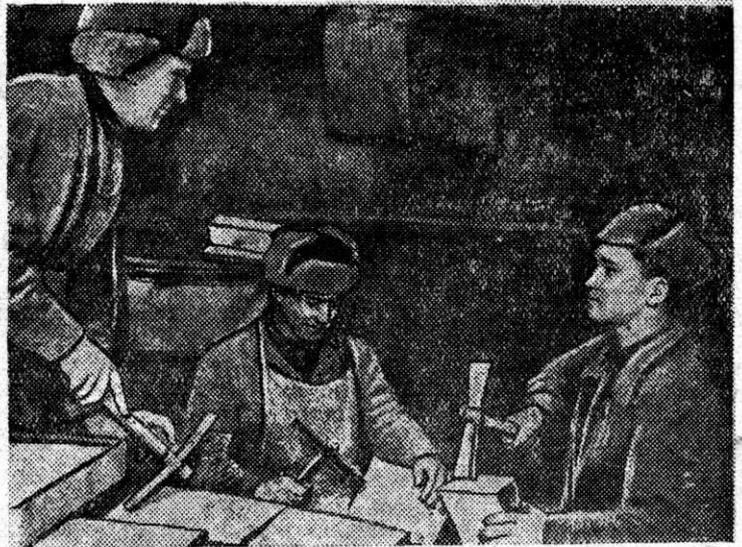

### Успехи передовых огнеупорщиков

Среди огнеупорщиков широко развернулось соревнование за завершение кладки в шахте к 5 апреля. 1 апреля многие бригады делом подтвердили свое обязательство. Бригада огнеупорщиков под руководством т. Горобец выполнила три нормы. По 280 процентов нормы в этот день выполнили бригады тт. Горячева и Федянина. Бригады

тт. Бакутина, Петровича и других выполнили свыше двух норм.

Хорошо потрудились огнеупорщики бригады т. Некрасова на футеровке самоваров. Сменное задание они выполнили на 175 проц.

Т. ДЕМИНЕВА, нормировщик треста «Уралдомремонт».

### Электросварщики задание выполнили

Электросварщикам основного механического цеха дали срочное задание наварить по 15 миллиметров металла на сработанные части газовых клапанов «Клинга». За выполнение этого задания дружно взялись электросварщики механического цеха тт. Попов, Кулик, Новиков и электросварщик котельно-ремонтного цеха т. Кирсанов.

Зная, что эти клапаны срочно нужны

для монтажа газового хозяйства домны № 6, они обязались выполнить задание раньше срока при отличном качестве и свое слово сдержали. К утру 2 апреля наварка была завершена.

И. ТИМИРГАЛЕЕВ, бригадир электросварщиков основного механического цеха.

### Поможем монтажникам

Многие работы по сборке агрегатов домны тормозятся вследствие того, что некоторые рабочие участвуют в ремонте впервые, не знают сущности механизмов домны. Это особенно дает себя чувствовать на сборке вагон-весов и гризлей. Затягивание работ на этих объектах может задержать своевременный ремонт домны № 6.

Поэтому бригады механиков доменного

цеха решили в выходной день, 3 апреля, выйти на эти участки, оказать существенную помощь ремонтникам. Наши люди хорошо знакомы с механизмами домны и смогут многое сделать, чтобы помочь ремонтникам досрочно выполнить задание по ремонту вагон-весов и гризлей.

А. ШУЛЬГИН, помощник начальника доменного цеха по оборудованию.
